


放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	廃炉中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		4月	5月				6月			7月			8月			9月			10月			11月以降			備 考	
						27	4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
						検 討 ・ 設 計	【A系】 処理運転				【B系】 処理運転			【共通系】																
●ガレキ等の屋外一時保管 解消（2028年度内）	●水処理二次廃棄物	保管管理計画	一時保管エリア の変更	(実 績／予 定)	検 討 ・ 設 計																									
			雑固体廃棄物焼 却設備	(実 績) ・処理運転（A・B系） (予 定) ・処理運転（A・B系） ・機電設備点検（A・B・共通系）	現 場 作 業	【A系】 処理運転																							・6月上旬よりA系の機電設備点検を予定 ・6月下旬よりB系の機電設備点検を予定 ・6月下旬より共通系の機電設備点検を予定	
			増設雑固体廃棄 物焼却設備	(実 績) ・機械・電気・計装設備点検 ・復旧工事 (予 定) ・機械・電気・計装設備点検 ・復旧工事	現 場 作 業	機電設備点検																						・機械・電気・計装設備点検中 ・施設の復旧工事を3月より開始 建物復旧工事に伴う定場設置、各所清掃作業および廃棄物貯留ビットコン クリート健全性調査を実施中		
			除染装置 (AREVA) スラッジ	(実 績) ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減 (予 定) ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減	検 討 ・ 設 計	スラッジ対処方法検討																						・廃スラッジ回収施設の耐震評価を実施中		
					現 場 作 業	建屋内線量低減																						・プロセス主建屋内の線量低減を実施中		
			2. 保管適正化 の推進のための 設備設置	減容処理設備	(実 績) ・処理運転 (予 定) ・処理運転 ・機械設備点検	現 場 作 業	処理運転																							・4月22日より処理運転再開 ・7月中旬より機械設備点検を予定
				固体廃棄物貯蔵 庫第10棟	(実 績) ・建築工事（10-C棟） (予 定) ・なし（設置工事完了）	検 討 ・ 設 計	建屋工事（10-C棟）																							・2023年 3月29日に建屋工事着工 ・2024年 8月23日：10-A棟 運用開始 ・2024年 10月29日：10-B棟 運用開始 ・2025年 4月 25日10-C棟 竣工 5月15日 10-C棟 運用開始
				固体廃棄物貯蔵 庫第11棟	(実 績／予 定) ・設計検討	検 討 ・ 設 計	設計検討																							・2021年2月13日の地震に関する影響評価を踏まえ、追加の耐震評価や 設計を実施中
				大型廃棄物保管 庫第一棟	(実 績) ・設計検討 ・建屋補強工事 (予 定) ・設計検討 ・建屋補強工事	検 討 ・ 設 計	設計検討（吸着塔架台）																							・2/13の地震に関する影響評価を踏まえ、2023年度内部工事開 始、2025年度耐震補強完了を目標とする ・2024年3月25日 実施計画変更申請（建屋補強） ・2024年7月19日 実施計画変更認可（建屋補強）
				大型廃棄物保管 庫第二棟	(実 績) ・設計検討 (予 定) ・設計検討	検 討 ・ 設 計	設計検討（建屋、機電）																							・設計実施中、2027年度実施計画申請・着工、2031～2032年 度運用開始を目標とする
				スラリー安定化 処理設備	(実 績) ・安定化処理設備の設計方針検討 (予 定) ・安定化処理設備の詳細設計検討 ・現地工事	検 討 ・ 設 計	安定化処理設備の設計検討																							・2022年9月12日 第102回監視・評価検討会において示された「審査 上の観点」を踏まえ、設計見直しを実施 ・HIC解体エリアを追加した設置候補地見直し後の耐震設計を含む詳細設 計を実施しており、耐震設計の状況を踏まえ、機器配置の見直しが生じた ことや建屋規模を踏まえた工事期間の反映実施。
						現 場 作 業																								現地工事 (2029年3月完了予定)

分野名	廃炉中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	4月	5月					6月			7月			8月			9月			10月			11月以降			備 考		
					27	4	11	18	25		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
固体廃棄物の保管管理、 処理・処分計画	●放射能濃度の評価と管理	3. 固体廃棄物の性状把握	(実 績) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析 (予 定) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析	検討・設計																											
					(採取継続)																										
					(分析継続)																										
					(2026年2月完了予定)																										
	●分析施設	4. 分析・研究施設の設置	JAEA分析・研究施設第1棟	(実 績) ・放射性物質を用いた分析作業 (分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む) (予 定) ・放射性物質を用いた分析作業 (分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)	現場作業																									・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材等を分析中 ・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている リスト：https://clads.jaea.go.jp/jp/rd/tech-info.html 検索：https://frandl-db.jaea.go.jp/FRAAnDLI/	
						(分析継続)																									
						放射性物質を用いた分析作業(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)																									
			JAEA分析・研究施設第2棟	(実 績/予 定) ・設置工事	現場作業	(設置工事継続)																									・2020年5月20日 実施計画変更認可申請 ・2024年12月11日 実施計画一部補正提出 ・2024年12月18日 実施計画変更認可 ・2025年3月25日 事前了解
総合分析施設	(実 績/予 定) ・設計検討（基本設計）	検討・設計																													

廃炉中長期実行プラン2025

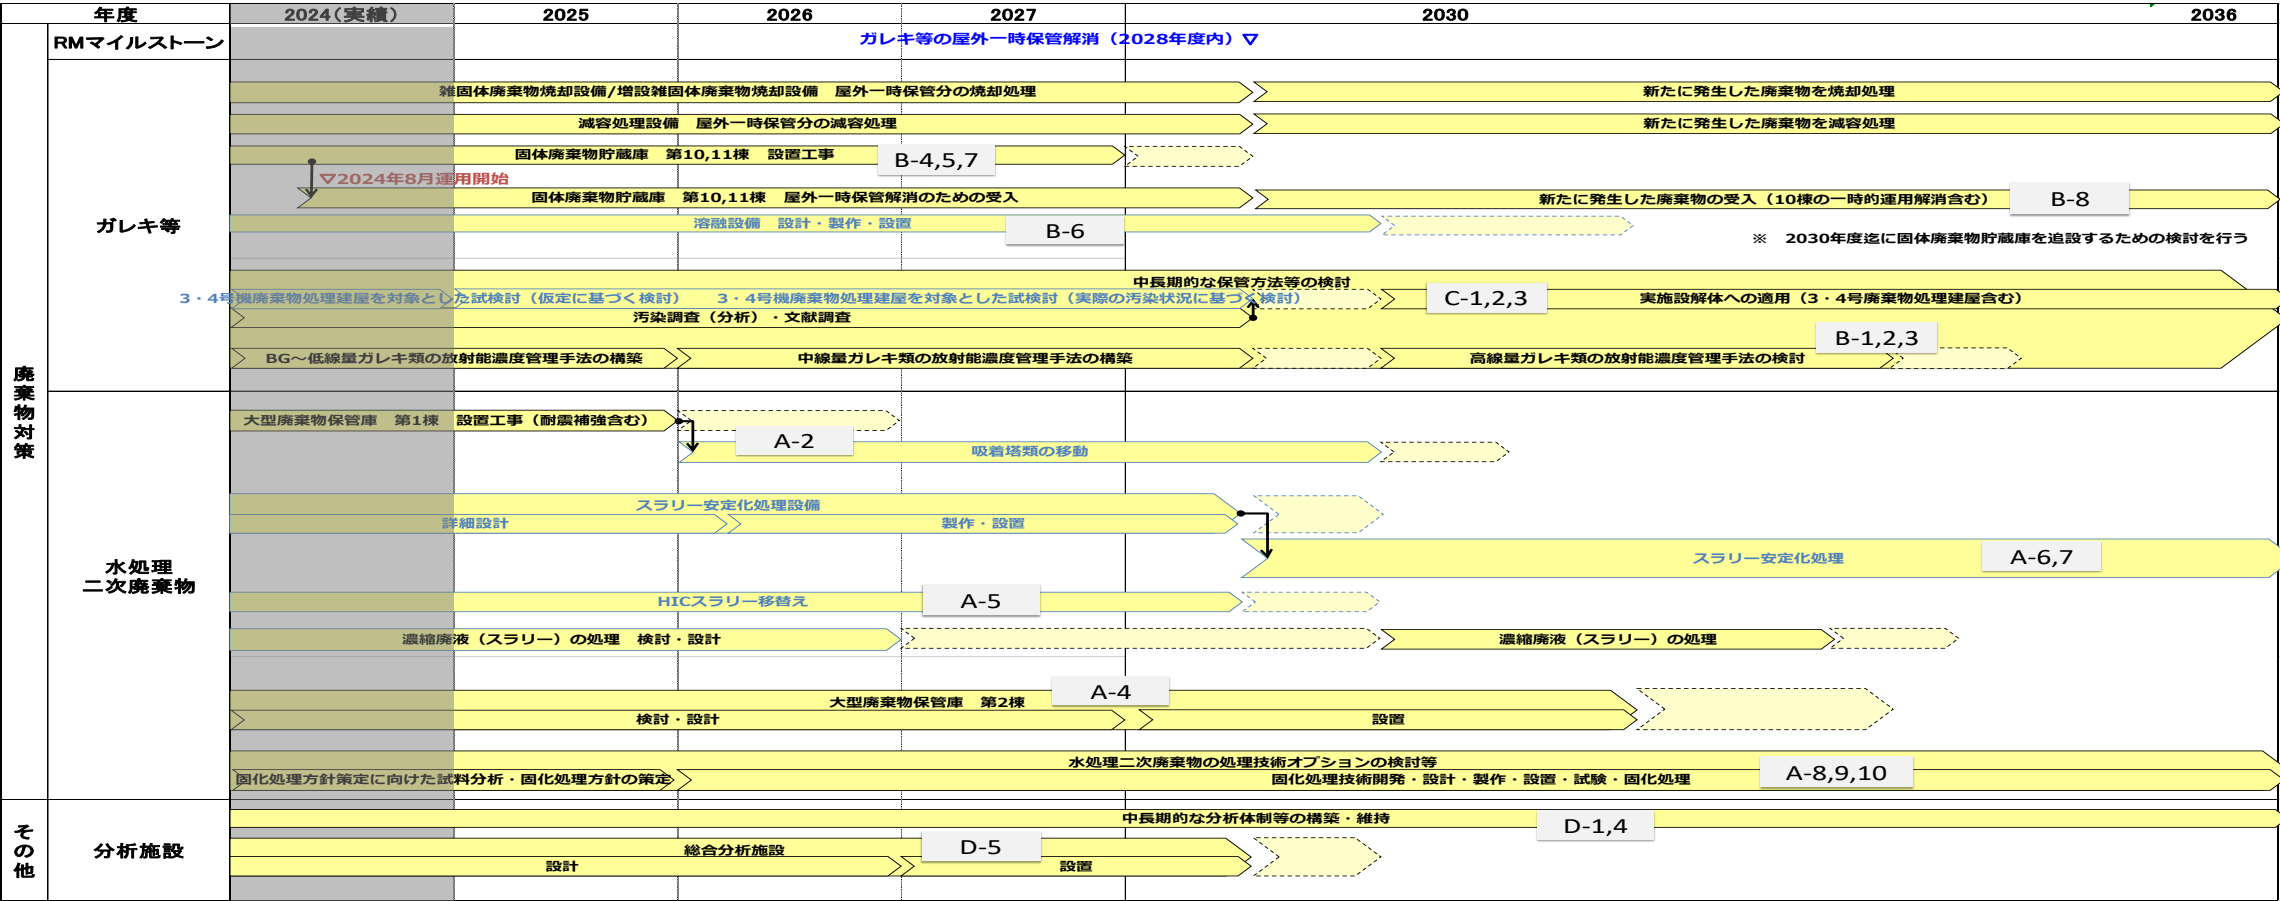

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

＜凡例＞

：作業の期間

：変更が見込まれる期間

：工程間の関連

：追加した工程

：変更/具体化した工程

：実施を取り止めた工程

：リスクマップに関連する工程
