



福島第一原子力発電所 1/2号機SGTS配管撤去（その1）の進捗について

- 1/2号機非常用ガス処理系（以下、SGTS）配管（下記図①～⑧）については、今後予定している1号機燃料取り出し用大型カバーの設置工事に干渉することから、工事干渉範囲のSGTS配管の一部を撤去する計画としています。
- SGTS配管撤去（その1）では全9本のSGTS配管を撤去する予定であり、7月14日までに1号機燃料取り出し用大型カバーの設置工事に干渉する8本（下記図①～⑧）のSGTS配管の撤去が完了しました。
- 配管⑨については、SGTS配管が廃棄物処理建屋建造物と干渉していることを3Dスキャン時に確認しております。建屋建造物撤去には周辺ガレキの撤去が必要なため、周辺ガレキ撤去後に建屋構造物撤去およびSGTS配管の撤去を行う予定です。
- これまでの作業において、ダストモニタに有意な変動は確認されていません。なお、撤去したSGTS配管については、細断を行った後、分析や保管を行う予定です。引き続き、ダスト濃度等を適切に監視しながら、周辺環境および作業員へ影響を与えぬよう、安全最優先に作業を進めてまいります。

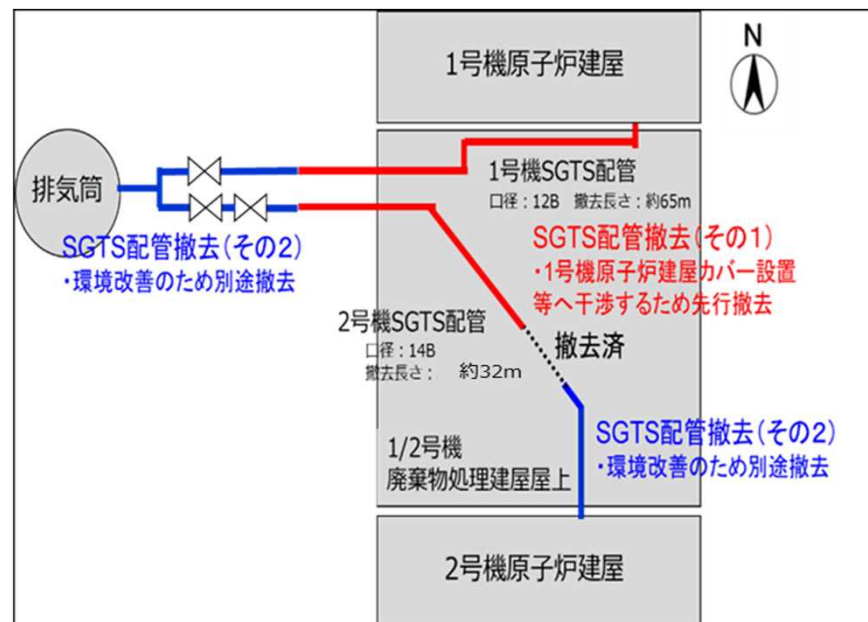

SGTS配管撤去（その1）の作業範囲

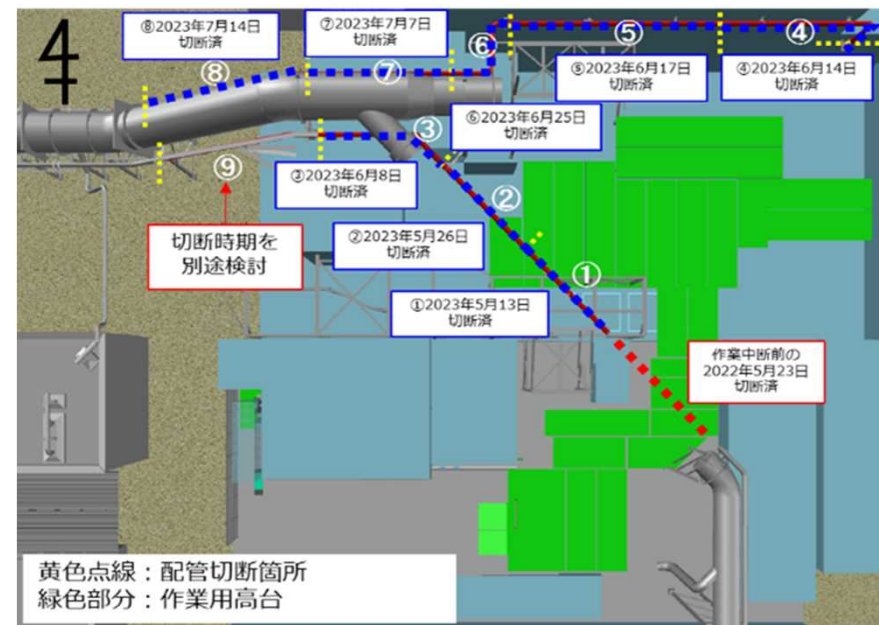

SGTS配管撤去（その1）の作業実績

1/2号SGTS配管撤去（その1）作業前後の状況

工事開始前
(2021年上期撮影)



現在の状況
(2023年7月14日撮影)

