


6号機における燃料装荷後の健全性確認について

資料1

2025年10月23日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

- 不具合のあった制御棒駆動機構について、予備品と入替後に電動での挿入・引抜き操作を実施するとともに、モーターの動作状況を電流測定し、引っかかりの兆候がないことを確認（10月9日実施）
- 他の204体についても、同様に引っかかりの兆候がないことを確認（10月16日実施）
- 制御棒駆動機構の入替箇所の「②原子炉圧力容器の漏えい確認」と、全ての制御棒について「③制御棒駆動機構の機能確認」を10月17日に実施
- また、本日(10月23日)、格納容器を一部開放した箇所について「④原子炉格納容器漏えい率確認」を再実施予定
- その他に原子炉建屋気密性能検査を予定しており、それらを含めて、今月中には技術的な準備が整う見込み
- 引き続き、設備の維持管理を行う中で、気づきや不適合対応などがあれば、一つひとつ確実に対応していく

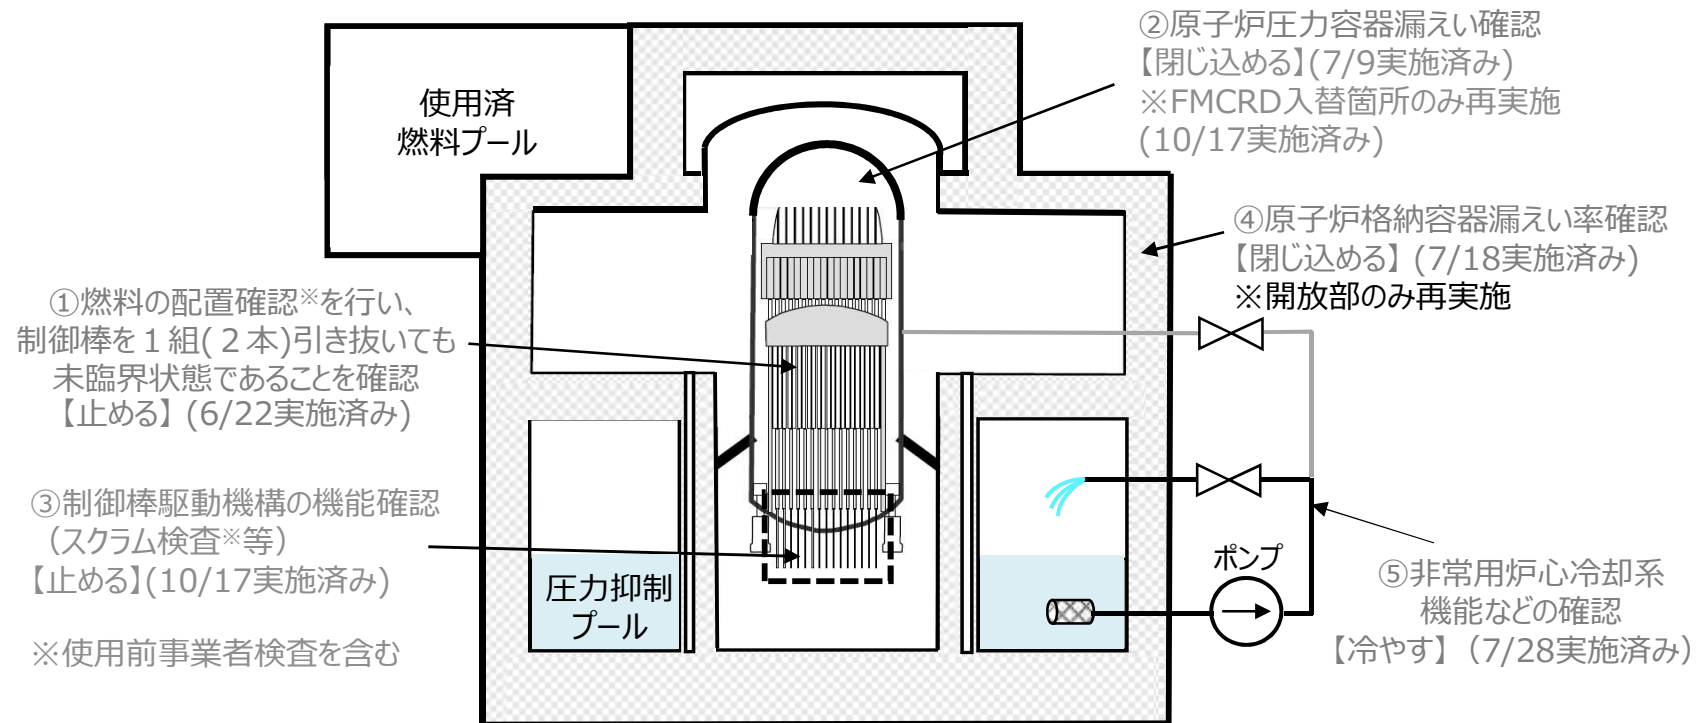

使用済燃料の 2025 年度号機間輸送計画の変更について

2025 年 10 月 23 日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所の使用済燃料プールで保管している使用済燃料について、未定としていた 2025 年度の号機間輸送計画（2025 年 3 月 28 日お知らせ済み）を、以下の通り変更いたします。

■輸送予定の対象号機、数量、時期

搬出元	輸送予定数量※	搬出先※	輸送予定時期※
6 号機	114 体	3 号機	2025 年度第 3 四半期

※ 輸送予定数量、搬出先及び輸送予定時期は変更になる場合があります。

以 上
