


福島第一原子力発電所1・2号機取水口間の護岸における地盤改良工事の開始について

< 参考資料 >
平成25年7月8日
東京電力株式会社

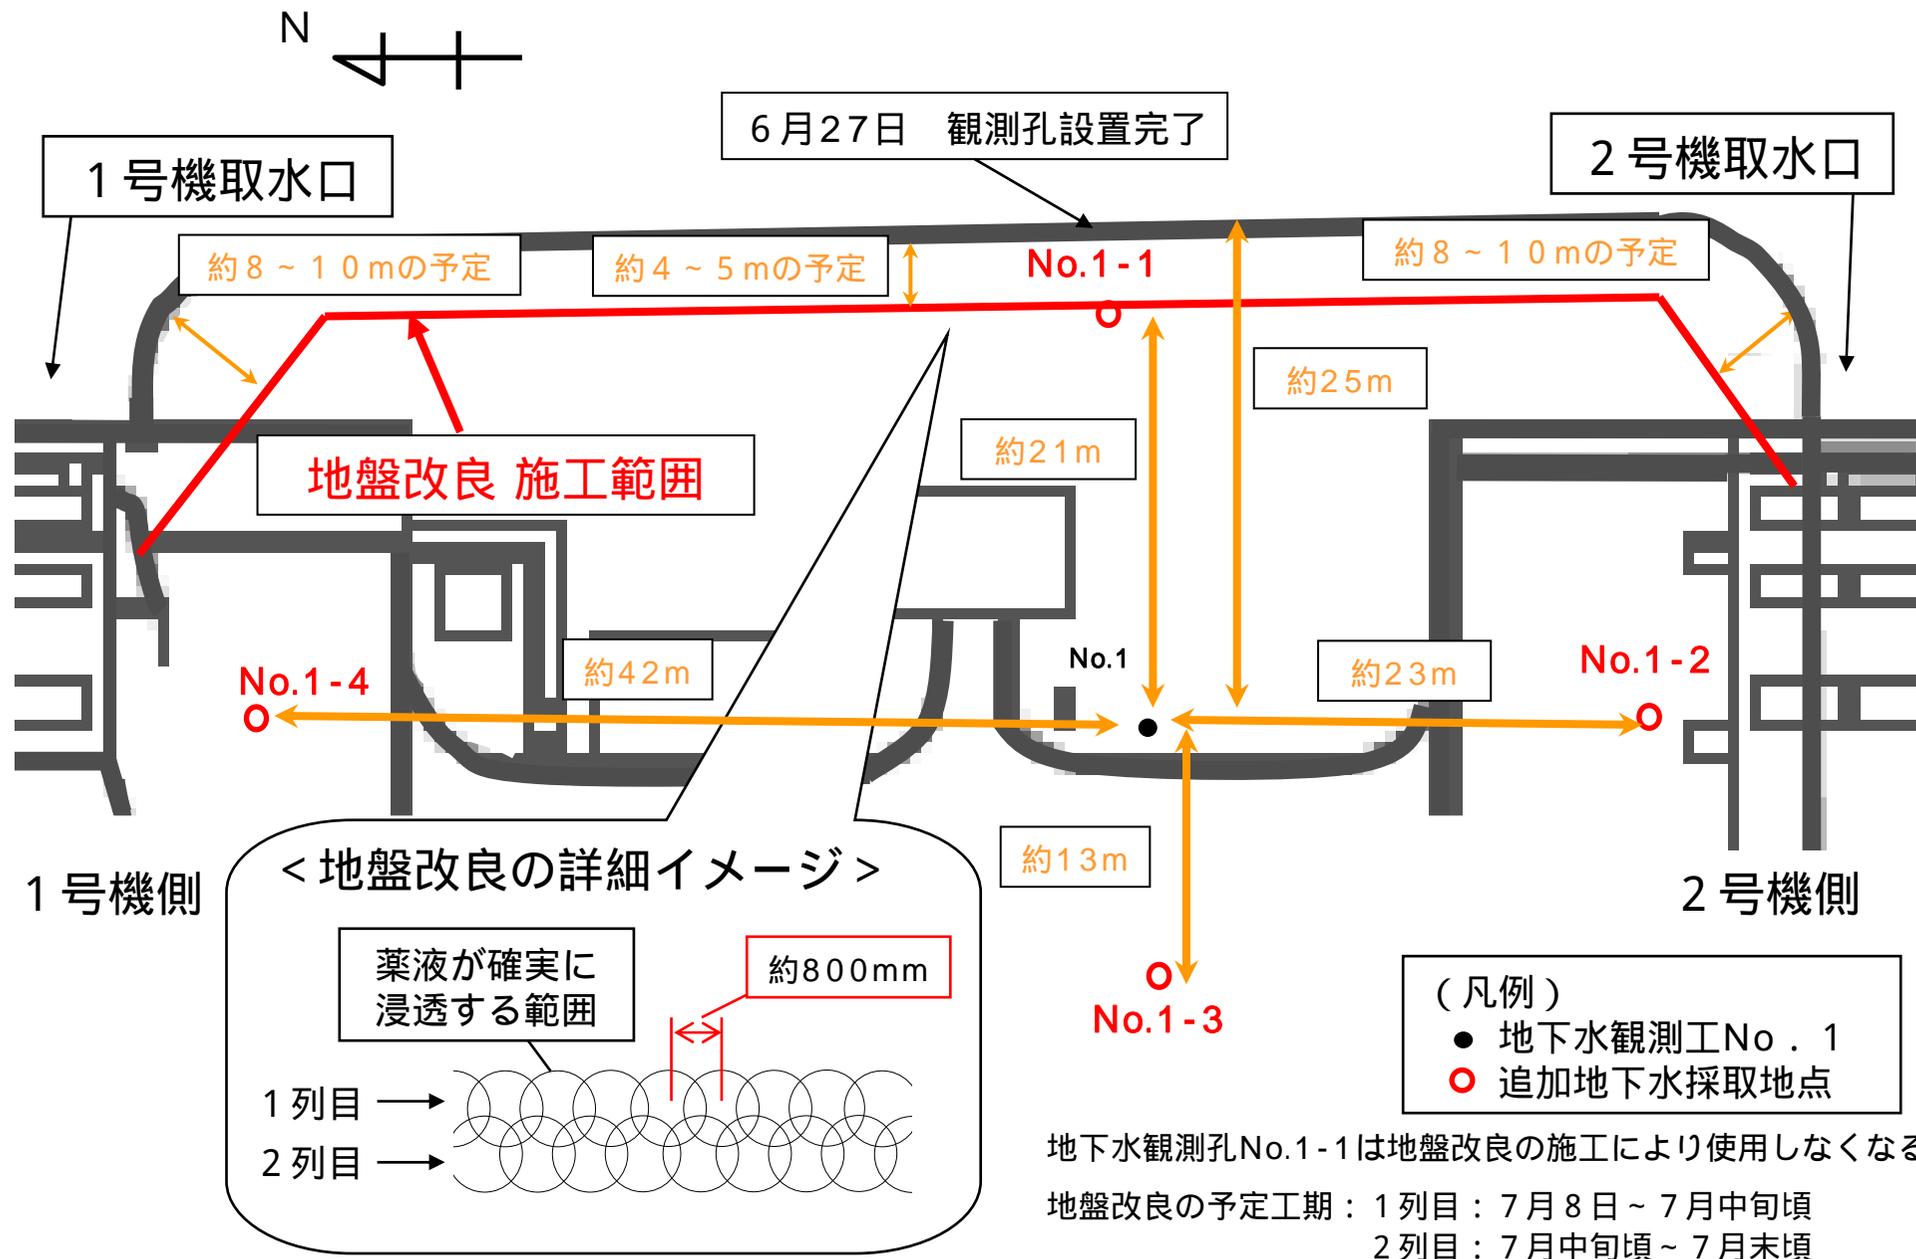


- 7月8日より地盤改良（薬液注入工）を開始、最大8班で施工
- 薬液注入は2列施工、そのうち1列目を先行して実施

< 予定表 >

工種	6月	7月					8月
	24	1	8	15	22	29	5
碎石撤去	—						
張りコンクリート取壊し	—	—					
タイロッド位置確認		—					
場内整備工		—					
薬液機材搬入・組立・解体（昼間）		プラント搬入、設置					プラント解体、搬出
薬液注入工 1列目（夜間）			注入工	中旬頃			
薬液注入工 2列目（夜間）					注入工		

< 参考 >
地盤改良施工方法

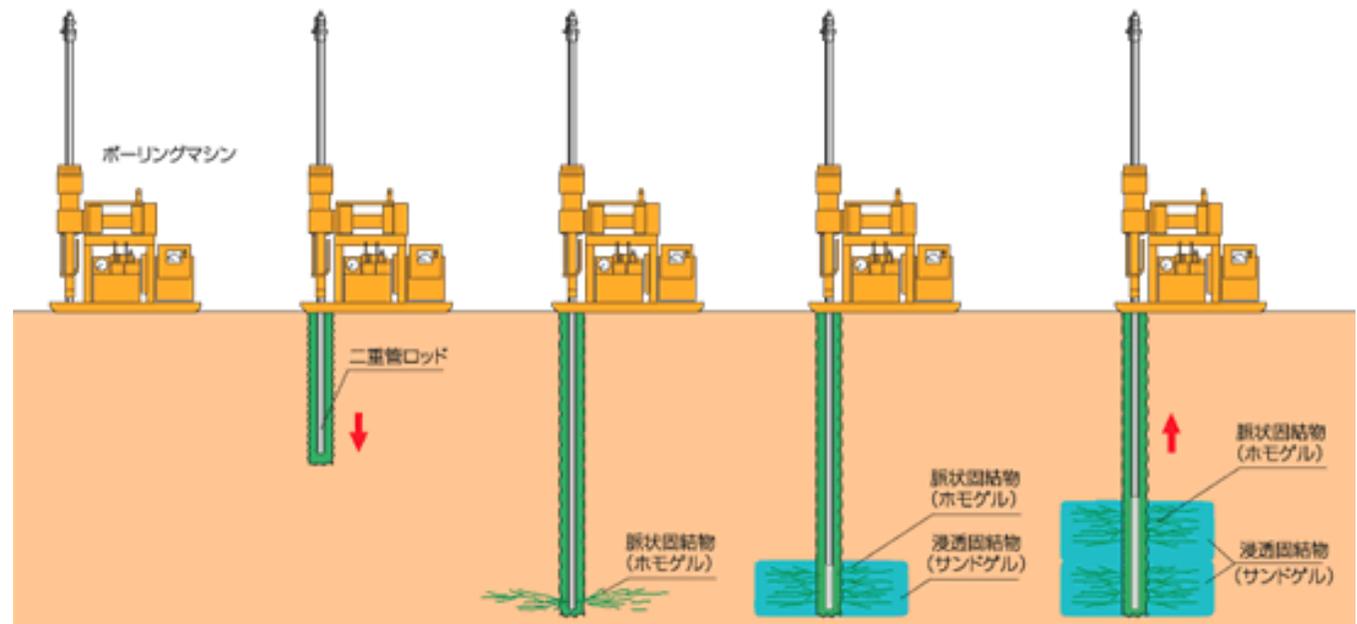

出典：ライト工業(株)マルチライザー工法パンフレット
