

1-2号機廃棄物処理建屋への流入抑制


2023年4月14日



東京電力ホールディングス株式会社

1-2号Rw/B屋上雨水排水工事完了について

- 「1/2号機廃棄物処理建屋への雨水流入抑制」は、1号機Rw/Bの排水ルート切替による屋上雨水の建屋内流入阻止により、2020年7月～10月に完成していた2号Rw/Bと合わせて2023年3月に1号Rw/Bも対策が完了した。
- 今後は、1号機カバー工事の準備に向け、SGTS配管撤去及びRw/B②工区のがれき撤去と並行して、ガレキ撤去範囲の防水塗装などを行う予定である。

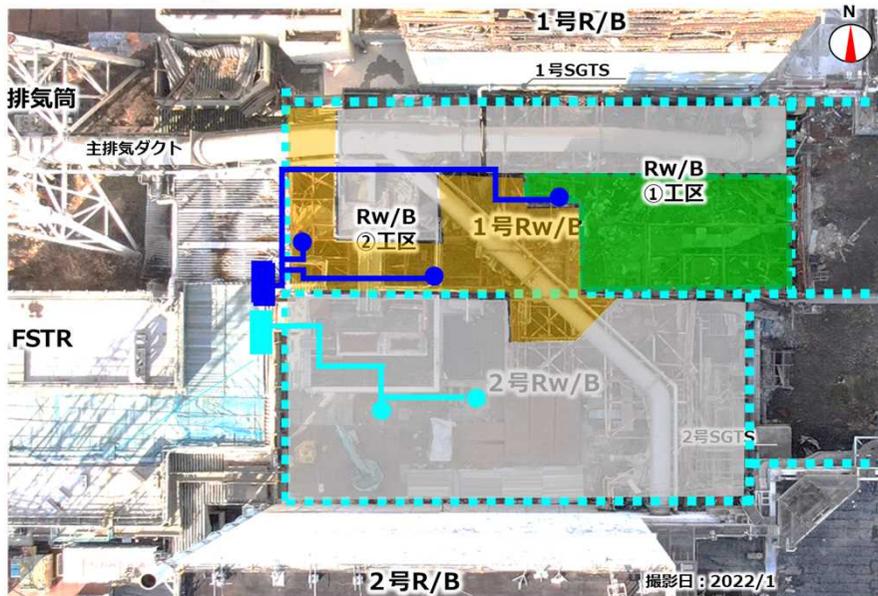

- : 排水ルート (2号Rw/B)2020年7～10月完成済
- : 排水ルート (1号Rw/B)2023年3月完成
- : 各建物の境界線
- : ガレキ撤去 (Rw/B②工区)
- : 防水塗装 (Rw/B①工区)
- : 防水塗装済み、今後基礎構築エリア

件名	2022年度						2023年度					
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
<ガレキ撤去工事>	ガレキ撤去 (RwB①工区)						SGTS配管撤去					
							ガレキ撤去 (RwB②工区)					
							防水塗装 (Rw/B①工区)					
							防水塗装 (Rw/B①工区)					
<排水ルート切替>							排水ルート新設 (1号機Rw/B)					
							雨水流入抑制完了					
