
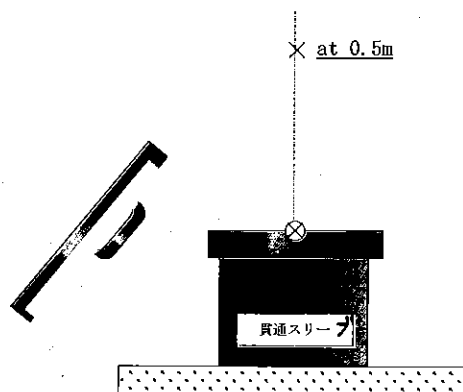


# 放射線サーベイ記録

測定目的	1F-2号機原子炉建屋屋上調査	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ ロスミア <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ ロダスト
測定場所	2号機R/Bオペフロ上部（屋上）	測定者	
測定日時	2018/8/23      15:10    ~    15:30	測定器	F1-ICW-130
測定条件	晴れ	区域区分	Yゾーン

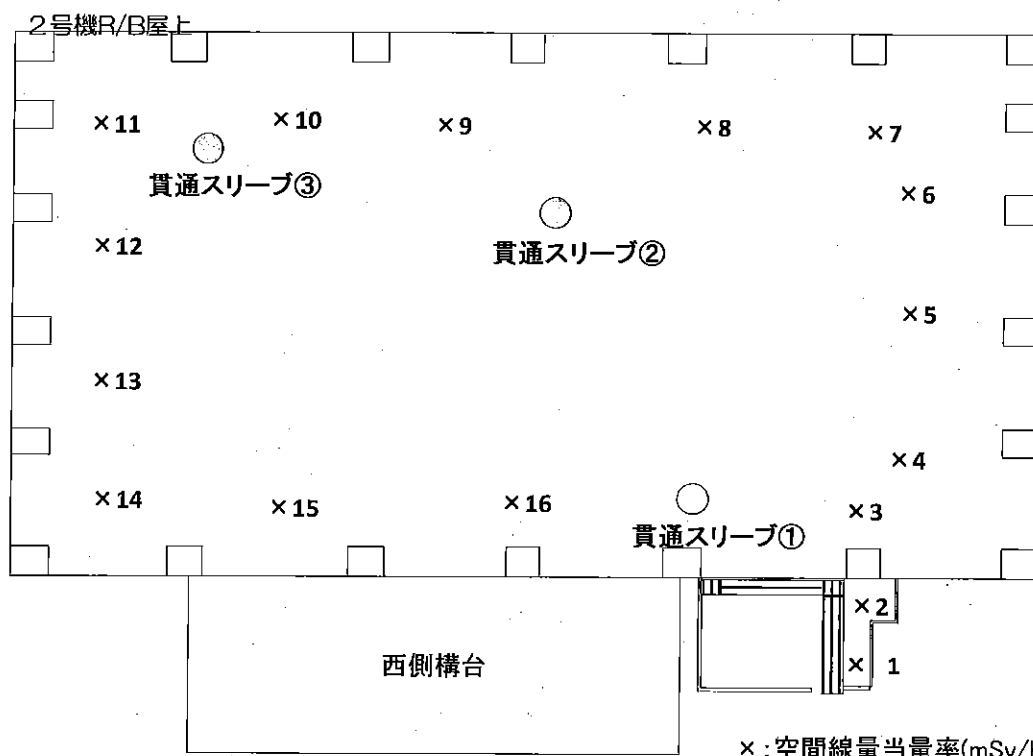

承認	審査	作成

# 放射線サーベイ記録

測定目的	1 F-2号機原子炉建屋屋上調査	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト
測定場所	2号機R/Bオペフロ上部（屋上）	測定者	
測定日時	2018/8/23      15:10    ~    15:30	測定器	F1-HCW-130
測定条件	晴れ	区域区分	Yゾーン

測定箇所	$\gamma$ (mSv/h)
1	0.15
2	0.35
3	0.7
4	1.0
5	1.2
6	1.1
7	0.7
8	1.0
9	1.2
10	1.0
11	1.0
12	1.0
13	0.75
14	0.7
15	0.6
16	0.85

測定箇所	$\gamma$ (mSv/h)	備考
貫通スリーブ①	0.75	遮へいあり
〃	1.0	〃 なし
貫通スリーブ②	2.0	遮へいあり
〃	4.0	〃 なし
貫通スリーブ③	1.0	遮へいあり
〃	2.0	〃 なし
