


1Fプロセス主建屋水中調査他業務委託

GM	メンバー


高温焼却炉設備建屋地下2階のゼオライト土壌等調査2の範囲における土壌位置及び水中線量測定値と確認できた物品等を以下のようにマッピングした。

土壌設置状況確認日	2020/3/5、3/6
水中線量測定日	2020/3/9、3/10、3/11、3/17
測定器	ミリオンキャンベラ社（本体）ポータブルガンマサーベイメータ Radiagem-2000／（検出器）超高線量ガンマプローブ STHF-R ※いずれもTEPCO殿借用品

土壌表面線量マップ

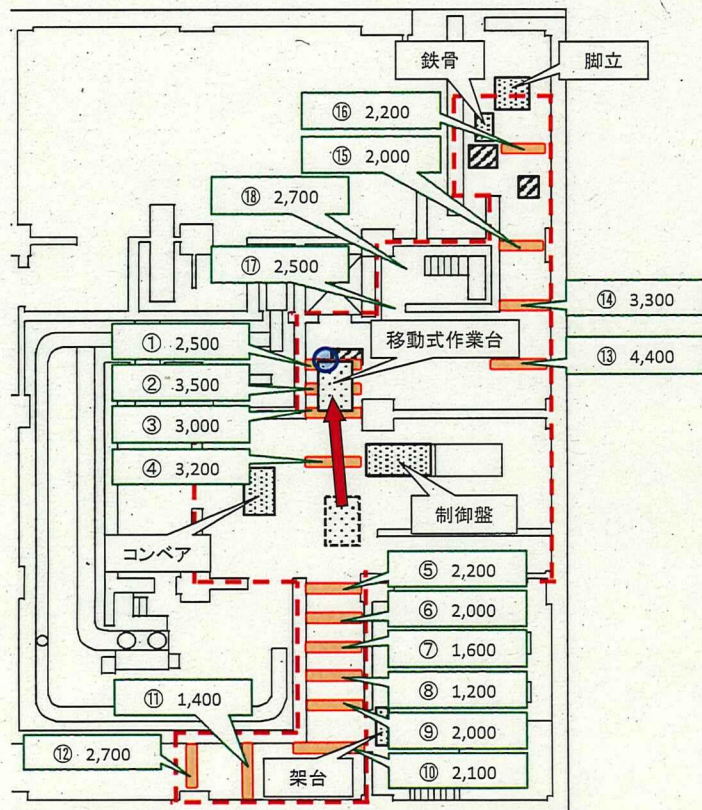

床面線量マップ

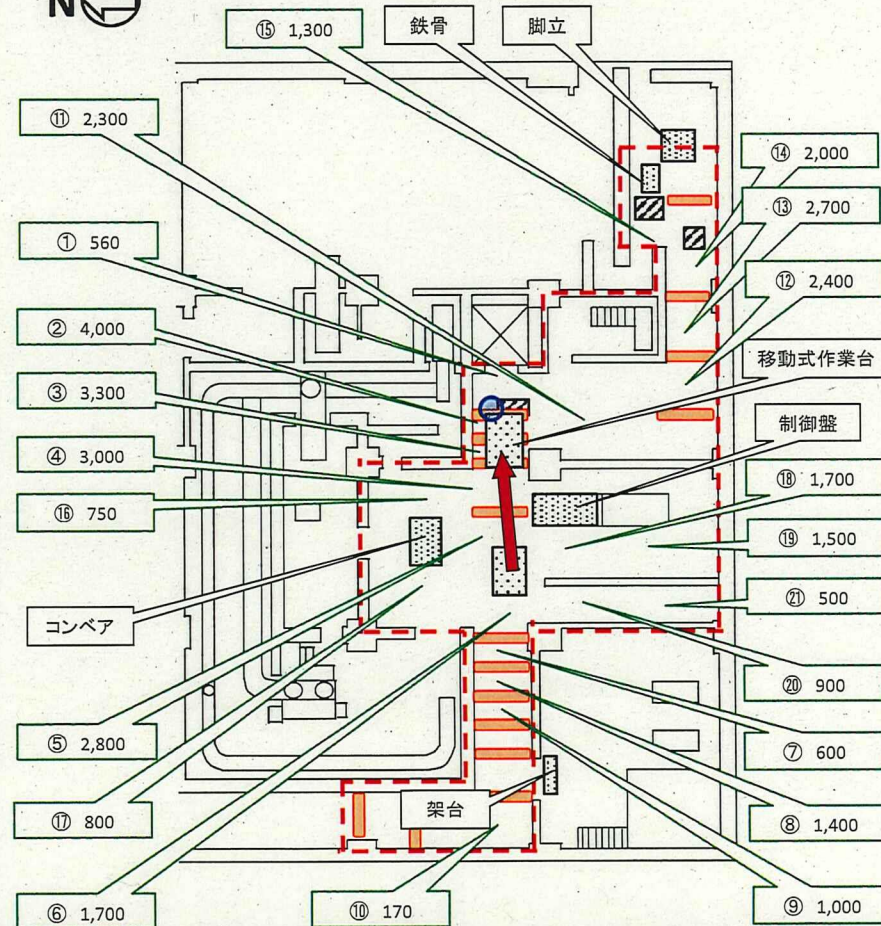

単位：mSv/h

- : ROV調査範囲
- : 設置物
- : ゼオライト土壌
- : 不明物品
- : ROV投入箇所
