


建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

<参考資料>  
2025年6月27日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

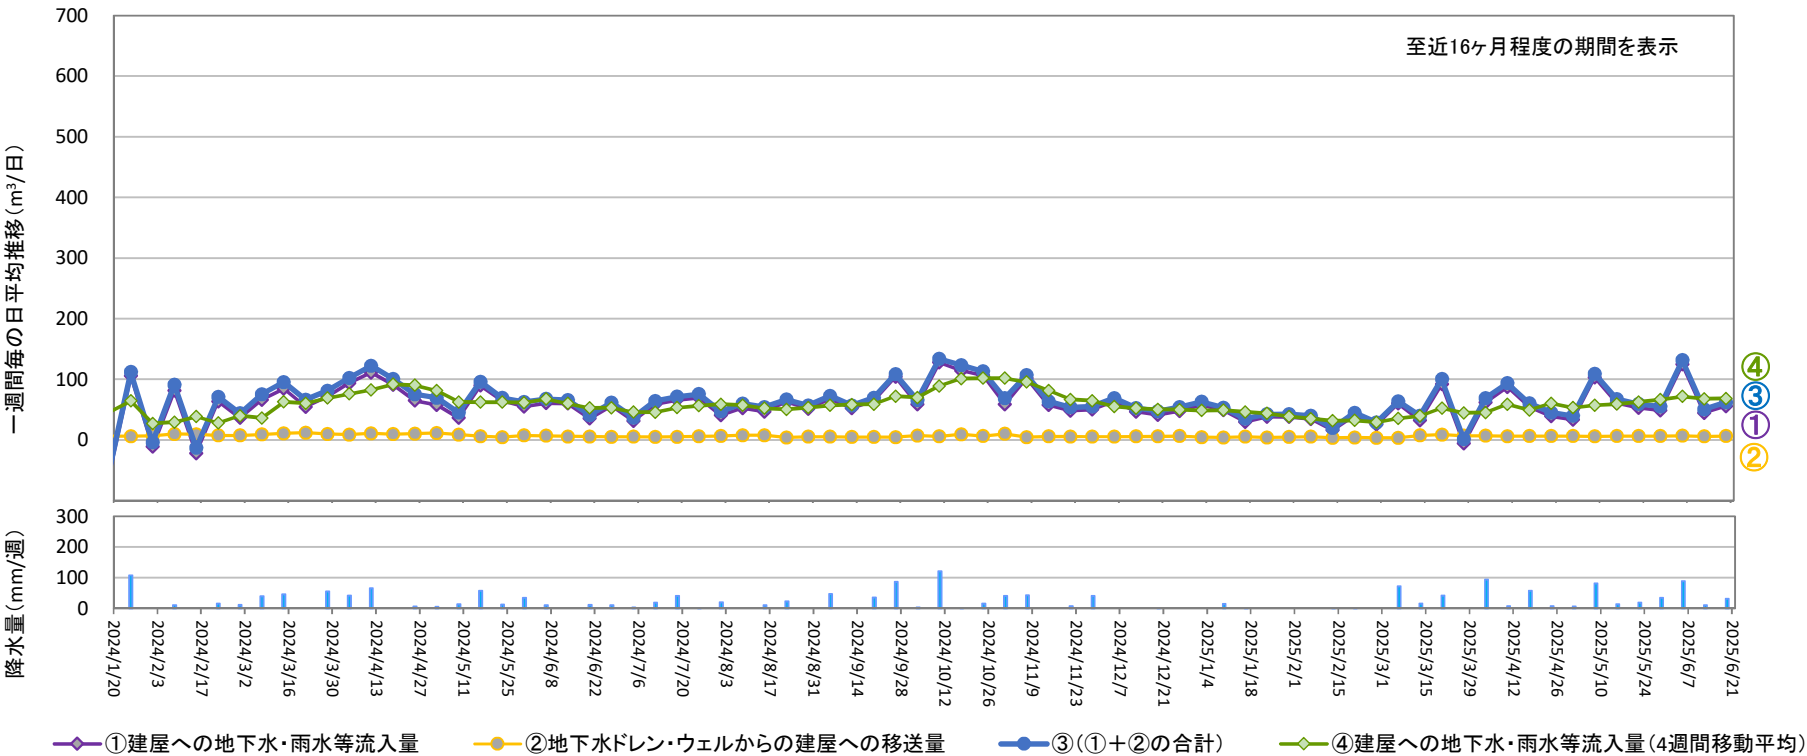

地下水ドレンからタービン建屋への移送量 ( 2025年6月12日 ~ 2025年6月18日 ) [m³／日]

| 日付              | 地下水ドレン中継タンク |   |   |       | (参考)改修ウェル、ウェルポイント |        |        |       | (参考)タービン建屋への移送量<br>[(α)+(β)] |
|-----------------|-------------|---|---|-------|-------------------|--------|--------|-------|------------------------------|
|                 | A           | B | C | 合計(α) | 1-2号機間            | 2-3号機間 | 3-4号機間 | 合計(β) |                              |
| 6月12日～<br>6月18日 | 0           | 0 | 0 | 0     | 6                 | 0      | 0      | 6     | 6                            |

①建屋への地下水・雨水等流入量： 56 m3/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量： 6m3/日, ③①+②の合計： 62m3/日, 降水量： 31.5mm/週  
なお、合計値は小数点第一位のデータを合計しているため、個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。  
※ 2024年4月4日からプロセス主建屋断面積を一部精緻化して①③④を算出。なお、引き続き算出時に不確かさを含むため、マイナスとなる場合があります。  
(参考)④建屋への地下水・雨水等流入量の4週間移動平均： 68 m3/日

(参考) 評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

