


建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

＜参考資料＞  
2025年8月29日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

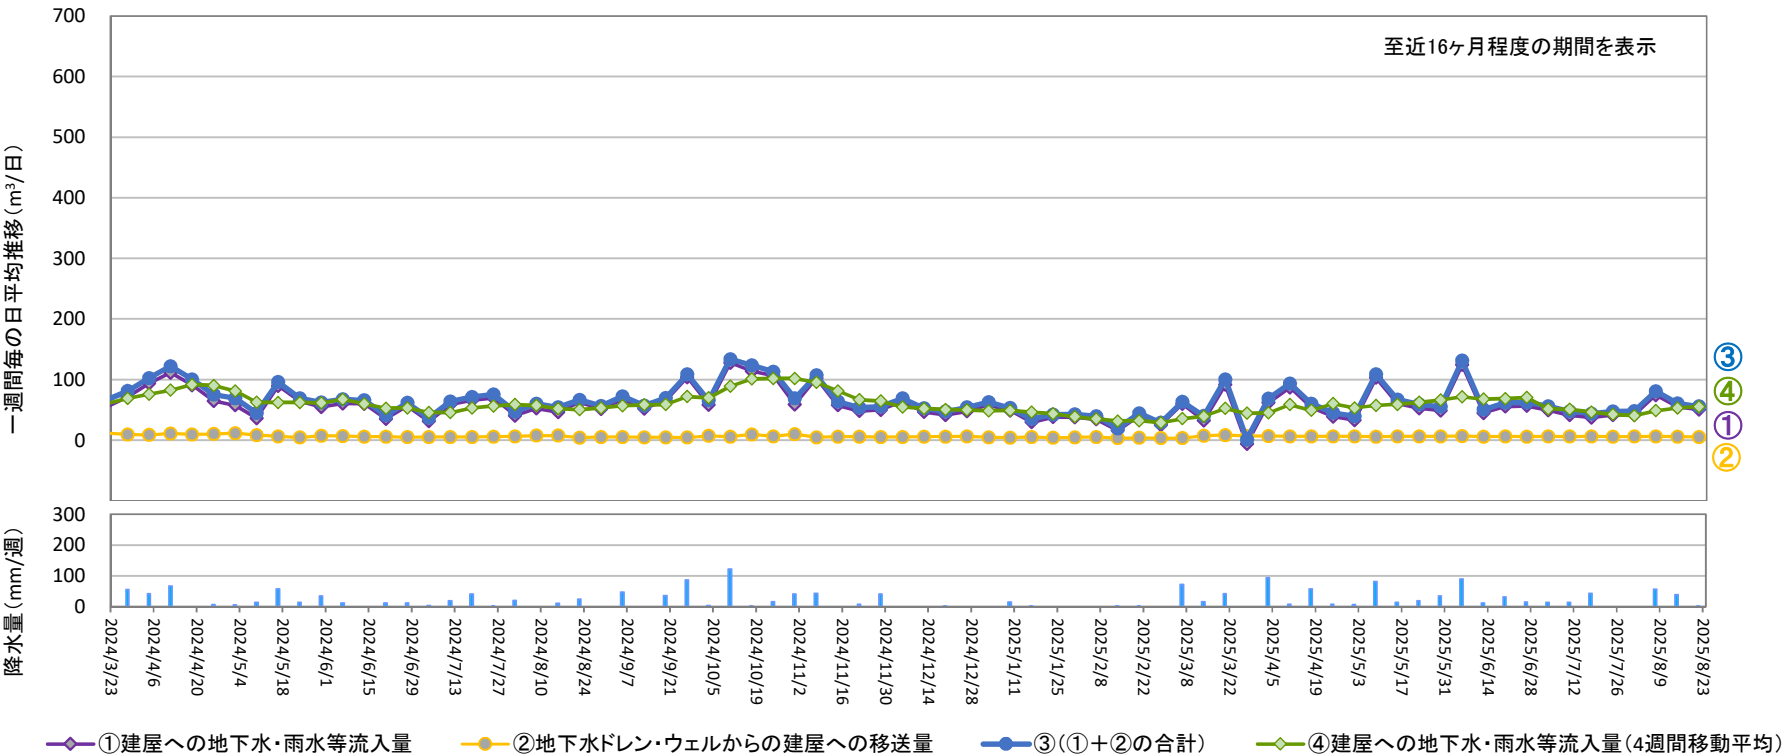

| 地下水ドレンからタービン建屋への移送量 |             |   |   |       | ( 2025年8月14日 ～ 2025年8月20日 ) |        |        |       |                              | [m <sup>3</sup> ／日] |
|---------------------|-------------|---|---|-------|-----------------------------|--------|--------|-------|------------------------------|---------------------|
| 日付                  | 地下水ドレン中継タンク |   |   |       | (参考)改修ウェル、ウェルポイント           |        |        |       | (参考)タービン建屋への移送量<br>[(α)+(β)] |                     |
|                     | A           | B | C | 合計(α) | 1-2号機間                      | 2-3号機間 | 3-4号機間 | 合計(β) |                              |                     |
| 8月14日～              | 0           | 0 | 0 | 0     | 5                           | 0      | 0      | 5     | 5                            |                     |
| 8月20日               |             |   |   |       |                             |        |        |       |                              |                     |

①建屋への地下水・雨水等流入量： 51 m3/日、 ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量： 5m3/日、 ③①+②の合計： 56m3/日、 降水量： 1.0mm/週

なお、合計値は小数点第一位のデータを合計しているため、個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

※ 2024年4月4日からプロセス主建屋断面積を一部精緻化して①③④を算出。なお、引き続き算出時に不確かさを含むため、マイナスとなる場合があります。

(参考)④建屋への地下水・雨水等流入量の4週間移動平均： 55 m3/日

(参考)評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

