

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年5月29日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

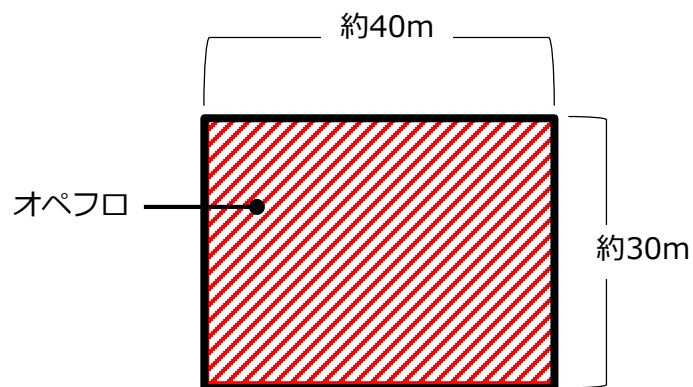
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

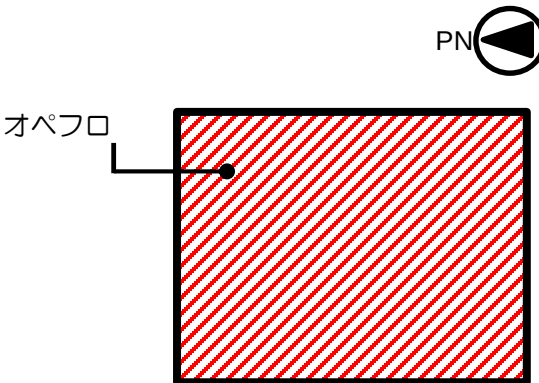
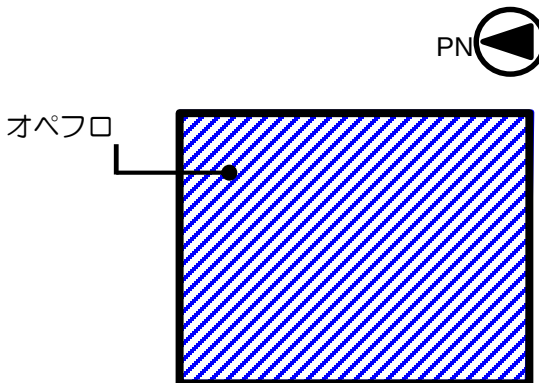
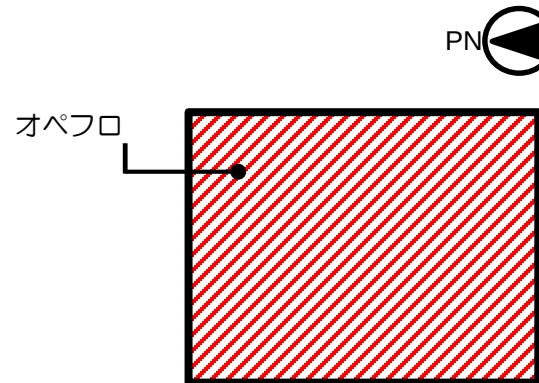


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（5月）	実績（5月）	計画（6月）
完了予定日：5月 26日 	完了日：5月 26日 	完了予定日：6月 17日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年5月29日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

日	20 (日)	21 (月)	22 (火)	23 (水)	24 (木)	25 (金)	26 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—
4月	散布予定	—	—	—	—	—	—
	散布実施	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※8	7.92E-05 (最大) ND (最小)	9.57E-05 (最大) ND (最小)	9.14E-05 (最大) ND (最小)	9.55E-05 (最大) ND (最小)	1.03E-04 (最大) ND (最小)	7.97E-05 (最大) ND (最小)
月	27 (日)	28 (月)	29 (火)	30 (水)	1 (木)	2 (金)	3 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—
5月	散布予定	—	—	—	—	—	—
	散布実施	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※9	9.82E-05 (最大) ND (最小)	7.95E-05 (最大) ND (最小)	7.67E-05 (最大) ND (最小)	7.70E-05 (最大) ND (最小)	8.57E-05 (最大) ND (最小)	8.23E-05 (最大) ND (最小)
火	4 (日)	5 (月)	6 (火)	7 (水)	8 (木)	9 (金)	10 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—
5月	散布予定	—	—	—	—	—	—
	散布実施	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※10	7.61E-05 (最大) ND (最小)	7.97E-05 (最大) ND (最小)	7.69E-05 (最大) ND (最小)	7.35E-05 (最大) ND (最小)	8.57E-05 (最大) ND (最小)	9.03E-05 (最大) ND (最小)
水	11 (日)	12 (月)	13 (火)	14 (水)	15 (木)	16 (金)	17 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—
5月	散布予定	—	—	—	—	—	—
	散布実施	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※11	1.03E-04 (最大) ND (最小)	7.43E-05 (最大) ND (最小)	9.73E-05 (最大) ND (最小)	7.96E-05 (最大) ND (最小)	7.16E-05 (最大) ND (最小)	9.17E-05 (最大) ND (最小)
木	18 (日)	19 (月)	20 (火)	21 (水)	22 (木)	23 (金)	24 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—
5月	散布予定	—	—	—	—	—	—
	散布実施	—	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※12	1.21E-04 (最大) ND (最小)	8.87E-05 (最大) ND (最小)	1.02E-04 (最大) ND (最小)	1.04E-04 (最大) ND (最小)	1.29E-04 (最大) ND (最小)	8.98E-05 (最大) ND (最小)
金	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	29 (木)	30 (金)	31 (土)
	散布対象作業	—	—	—	—	—	—
5月	散布予定	○	—	—	—	—	—
	散布実施	○	—	—	—	—	—
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※13	7.57E-05 (最大) ND (最小)	— (最大) — (最小)	— (最大) — (最小)	— (最大) — (最小)	— (最大) — (最小)	— (最大) — (最小)

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2025年5月26日時点
