

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

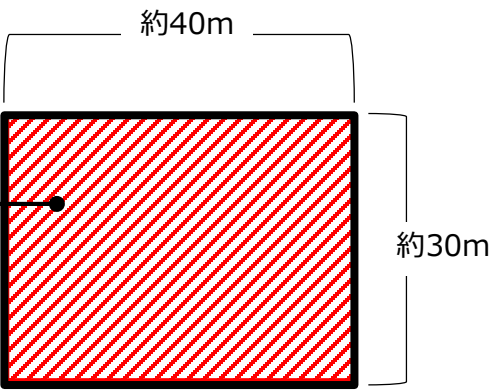
2025年9月25日



東京電力ホールディングス株式会社

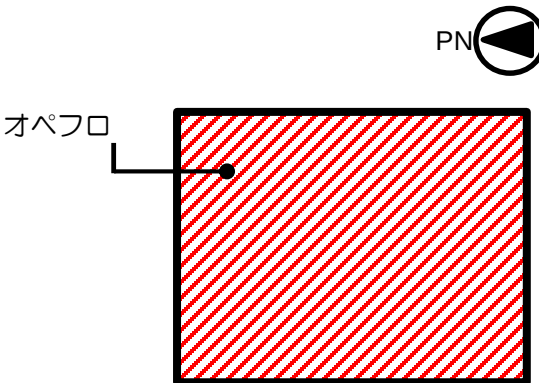
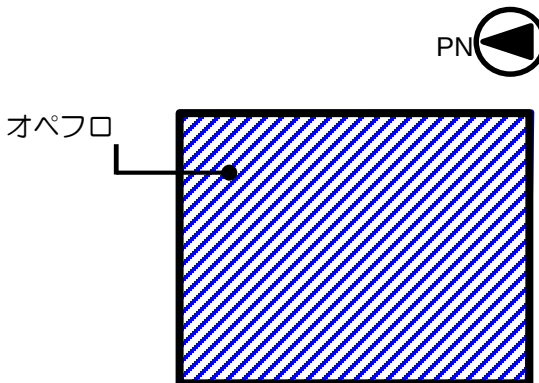
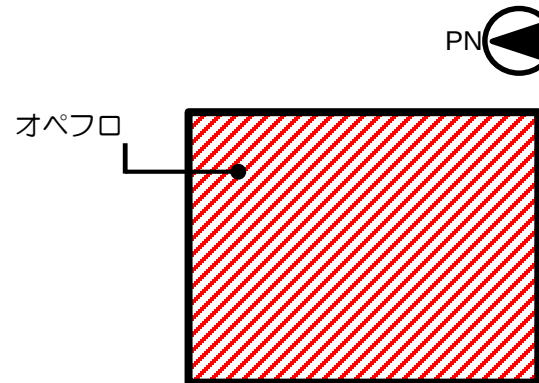
1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻 度	1回/月
標準散布量	1.5L/m ² 以上
濃 度	1/10
散布範囲	PN  【凡例】 ：散布範囲 約40m  約30m
散布面積	1,234m ²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（9月）	実績（9月）	計画（10月）
完了予定日：9月 9日 	完了日：9月 9日 	完了予定日：10月 24日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年9月19日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

8月	火	10（日）	11（月）	12（火）	13（水）	14（木）	15（金）	16（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	○	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.56E-05（最大）	4.27E-05（最大）	2.81E-05（最大）	2.22E-05（最大）	3.40E-05（最大）	2.52E-05（最大）	2.51E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	水	17（日）	18（月）	19（火）	20（水）	21（木）	22（金）	23（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	○	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	2.22E-05（最大）	2.81E-05（最大）	2.51E-05（最大）	2.81E-05（最大）	1.63E-05（最大）	3.10E-05（最大）	4.28E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	木	24（日）	25（月）	26（火）	27（水）	28（木）	29（金）	30（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	2.81E-05（最大）	6.04E-05（最大）	3.69E-05（最大）	5.46E-05（最大）	4.28E-05（最大）	4.27E-05（最大）	1.34E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
9月	金	31（日）	1（月）	2（火）	3（水）	4（木）	5（金）	6（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.40E-05（最大）	6.12E-05（最大）	8.47E-05（最大）	5.99E-05（最大）	1.06E-04（最大）	5.33E-05（最大）	6.63E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	土	7（日）	8（月）	9（火）	10（水）	11（木）	12（金）	13（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	○	－	－	－	－
	散布実施	－	－	○	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.63E-05（最大）	7.95E-05（最大）	6.38E-05（最大）	6.90E-05（最大）	4.03E-05（最大）	7.16E-05（最大）	7.17E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	日	14（日）	15（月）	16（火）	17（水）	18（木）	19（金）	20（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	9.26E-05（最大）	7.95E-05（最大）	7.95E-05（最大）	9.28E-05（最大）	9.01E-05（最大）	－（最大）	－（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	－（最小）	－（最小）

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2025年9月19日時点
