

福島第一原子力発電所 3号機燃料取り出し作業の 実施状況について（ハンドル変形燃料の輸送容器への装填）

< 参 考 資 料 >
2 0 2 1 年 2 月 3 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 本日（2月3日）午前9時55分より、第76回目となる3号機燃料取り出し作業を開始しており、3号機使用済燃料プールにおいて、ハンドル変形燃料を輸送容器へ装填する作業を初めて実施しました。
- 本日は、ハンドル変形量の大きい燃料2体（次頁⑨⑩）を、2体収納タイプの輸送容器に装填しました。（装填終了時間：午前11時53分）
（装填終了数：計526体/566体）
- 当該燃料については、今後、共用プールへ移送いたします。
- 2020年度末までの566体の取り出し完了に向けて、引き続き安全第一で確実に作業を進めてまいります。




吊り上げ（⑩）



輸送容器への装填（⑨）

【参考】燃料配置図

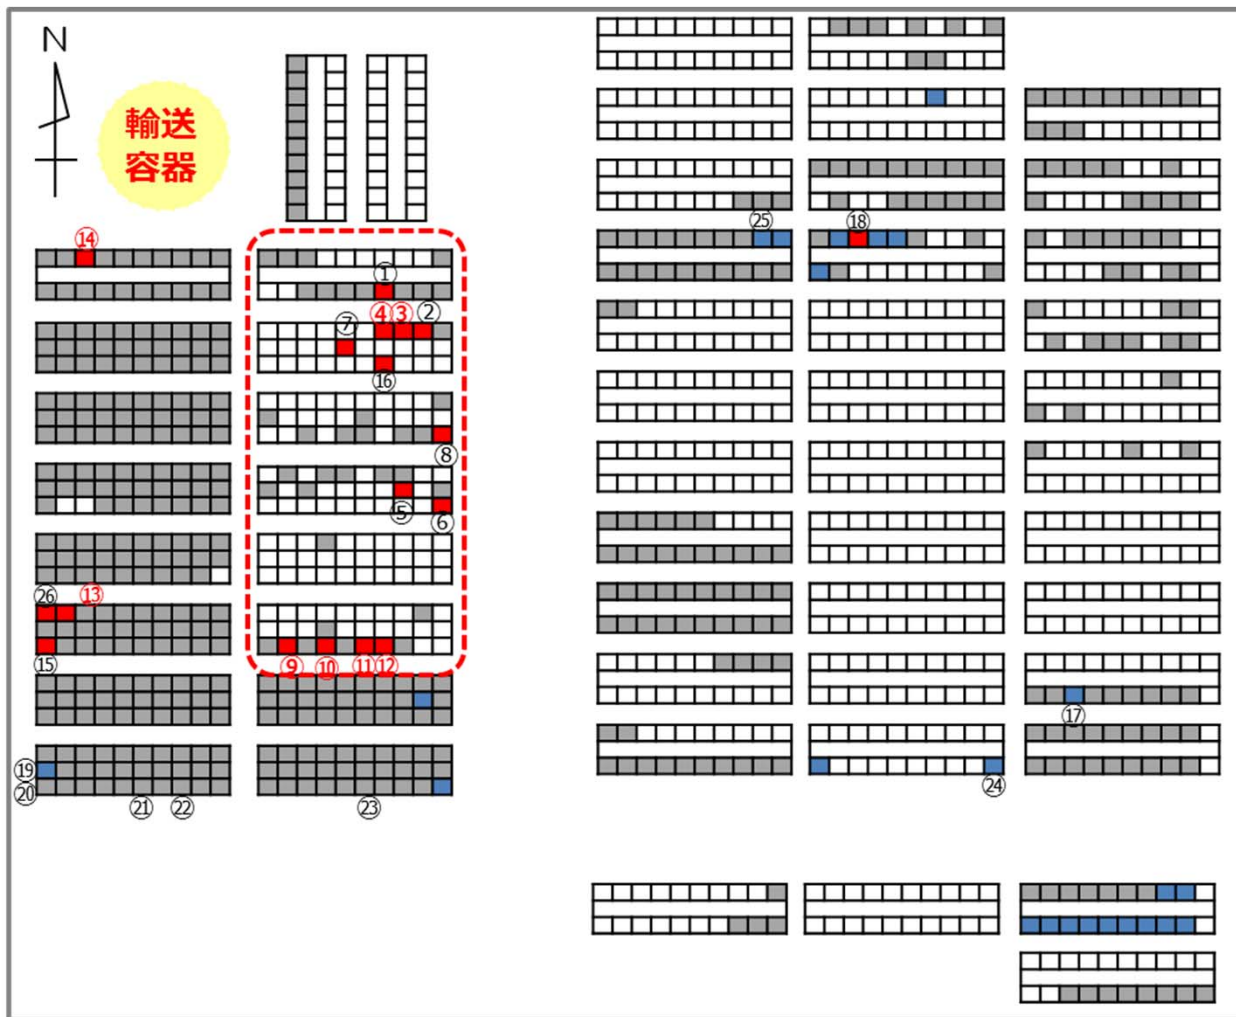

変形有無	吊り上げ確認状況	体数
ハンドル変形無し	吊り上げ可	24
ハンドル変形有り	吊り上げ可	18
合計		42

- : ハンドル変形燃料
- : ガレキ撤去中
- : ガレキ撤去完了
- : 燃料取り出し済
- : 燃料が入っていないラック
- : 燃料交換機, コンクリートハッチが落下したエリア
- ①~⑬, ⑱, ⑳ : ハンドル変形燃料
- ⑭, ⑰~㉑ : 干渉解除できた通常燃料

2体キャスク
輸送予定の燃料

③ ④ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
