


福島第一原子力発電所 3号機燃料取り出し作業の実施状況について（ハンドル変形燃料の取り出し作業）

< 参 考 資 料 >
2 0 2 1 年 2 月 1 7 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 2月3日、第76回目となる3号機燃料取り出し作業において、初となるハンドル変形燃料2体（ハンドル大変形燃料）の取り出し作業を開始し、2月5日に作業を終了しています。
- 4体あるハンドル大変形燃料のうち、残り2体についても第80回目の作業において2月12日午後11時23分に3号機使用済燃料プールにて取り出し作業を開始し、本日（2月17日）午後2時22分に共用プールにおいて作業を終了しています。
（計544体/566体）
- 2020年度末までの566体の取り出し完了に向けて、引き続き安全第一で確実に作業を進めてまいります。


【共用プールにおける作業の状況】(2/5)

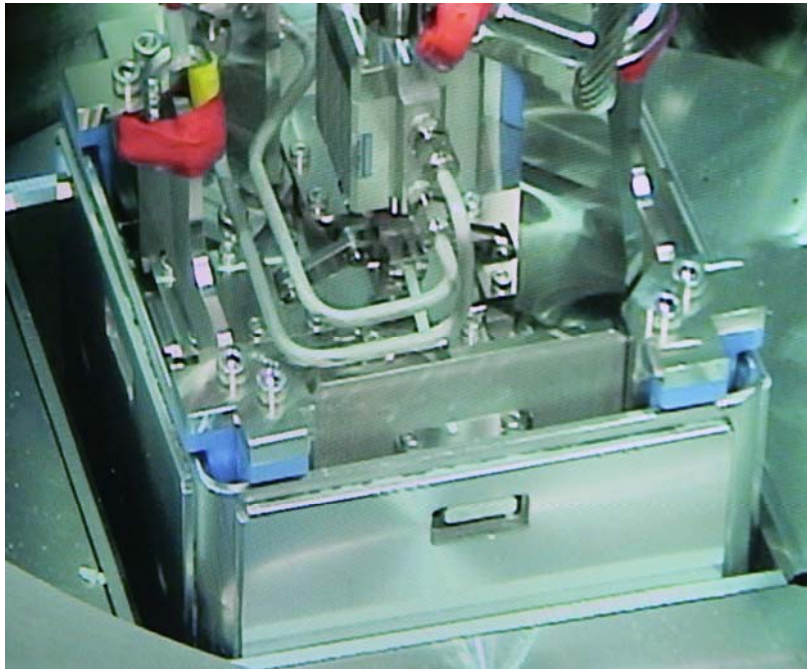

輸送容器からの吊り上げ




キャスクピット内からの移動

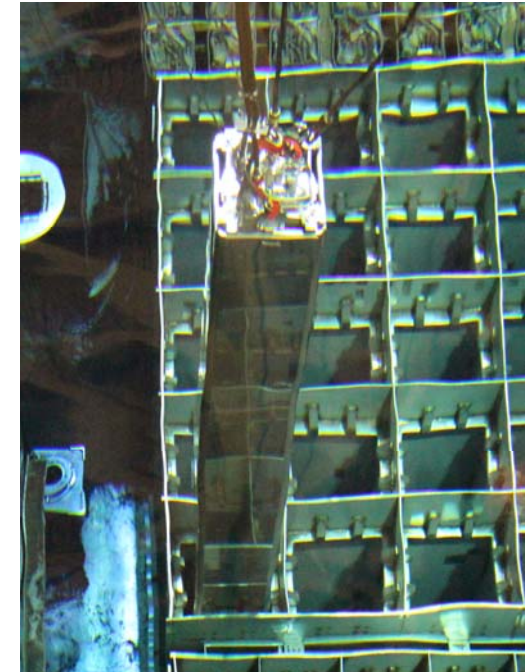

燃料ラックへの装填

【参考】燃料配置図

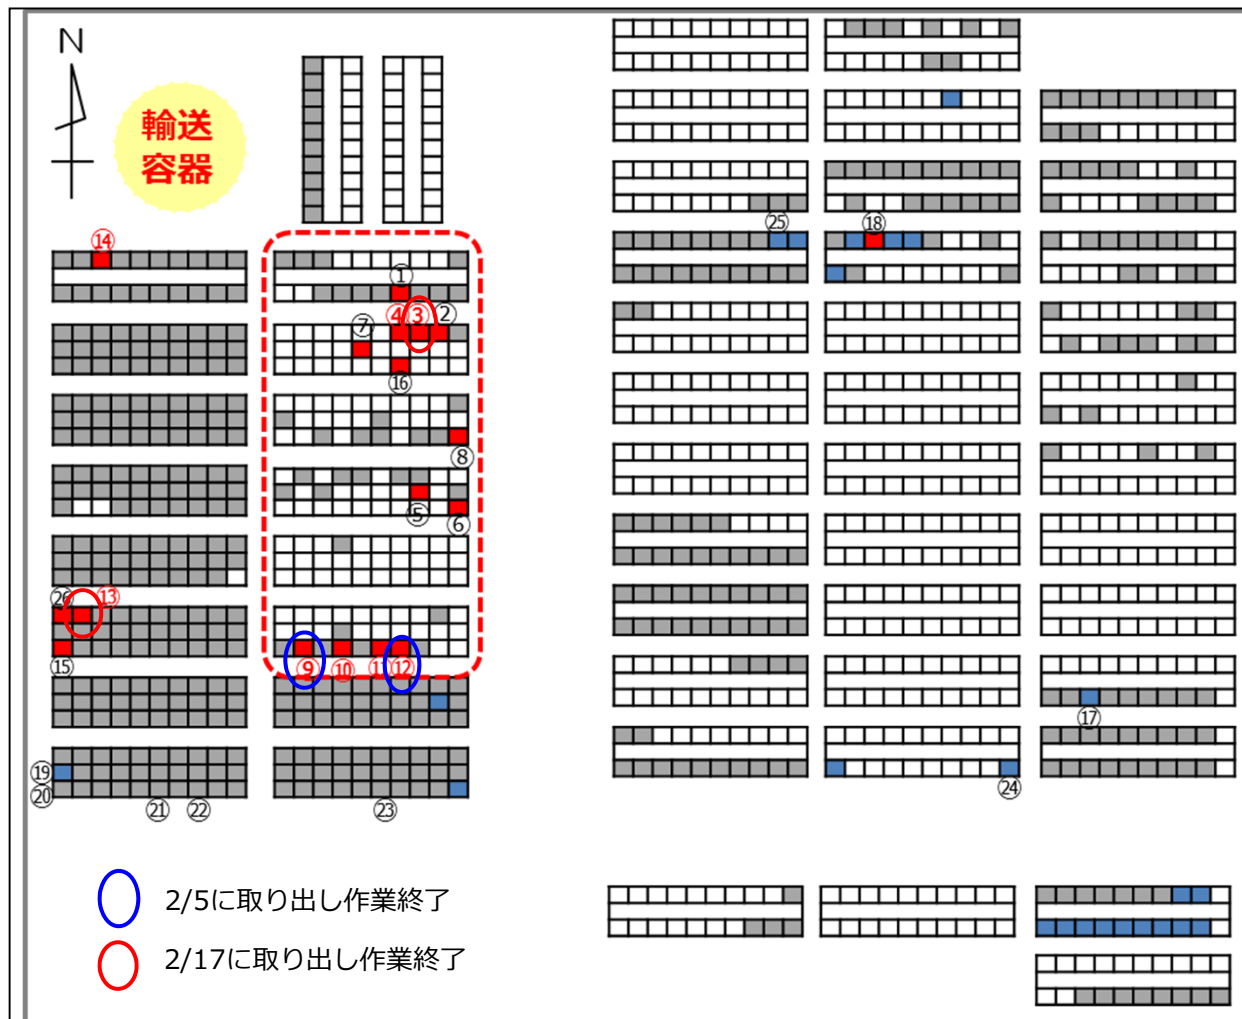

- : ハンドル変形燃料
- : ガレキ撤去中
- : ガレキ撤去完了
- : 燃料取り出し済
- : 燃料が入っていないラック
- : 燃料交換機, コンクリートハッチが落下したエリア
- ①~⑱, ㉖ : ハンドル変形燃料
- ㉗, ㉘~㉚ : 干渉解除できた通常燃料
