

福島第一原子力発電所 J9エリアタンクの解体作業完了

< 参 考 資 料 >
2 0 2 5 年 9 月 3 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 2025年2月14日からJ9エリアで進めている溶接型タンクの解体について、本日（9月3日）午前8時30分頃、12基目の底板をクレーンでつり上げて集積場所へ移動し、タンク解体作業が完了しました。今後は、2025年度内を目途に堰や付帯設備の撤去を行い、J9エリア全体の作業が完了する予定です。
- なお、J9エリアに隣接するJ8エリアの溶接型タンクの解体作業については、貯留している処理途上水を移送したうえで、2025年度内の着手を計画しています。
- 引き続き、J9エリアの作業で得られた知見を生かしながら、安全最優先でJ8エリアのタンク解体を進めてまいります。




<解体作業着手前のJ9エリア>
(2月13日 撮影)



<解体作業が完了したJ9エリア>
(9月3日午前8時30分頃 撮影)

【参考】J8、J9エリアタンクの解体概要

- J9エリアタンク1基の容量は700m³、直径は約9m、高さは約12m。
- J9エリアの敷地は約1,600m²（外堰）、J8エリアの敷地は約1,300m²（外堰）。

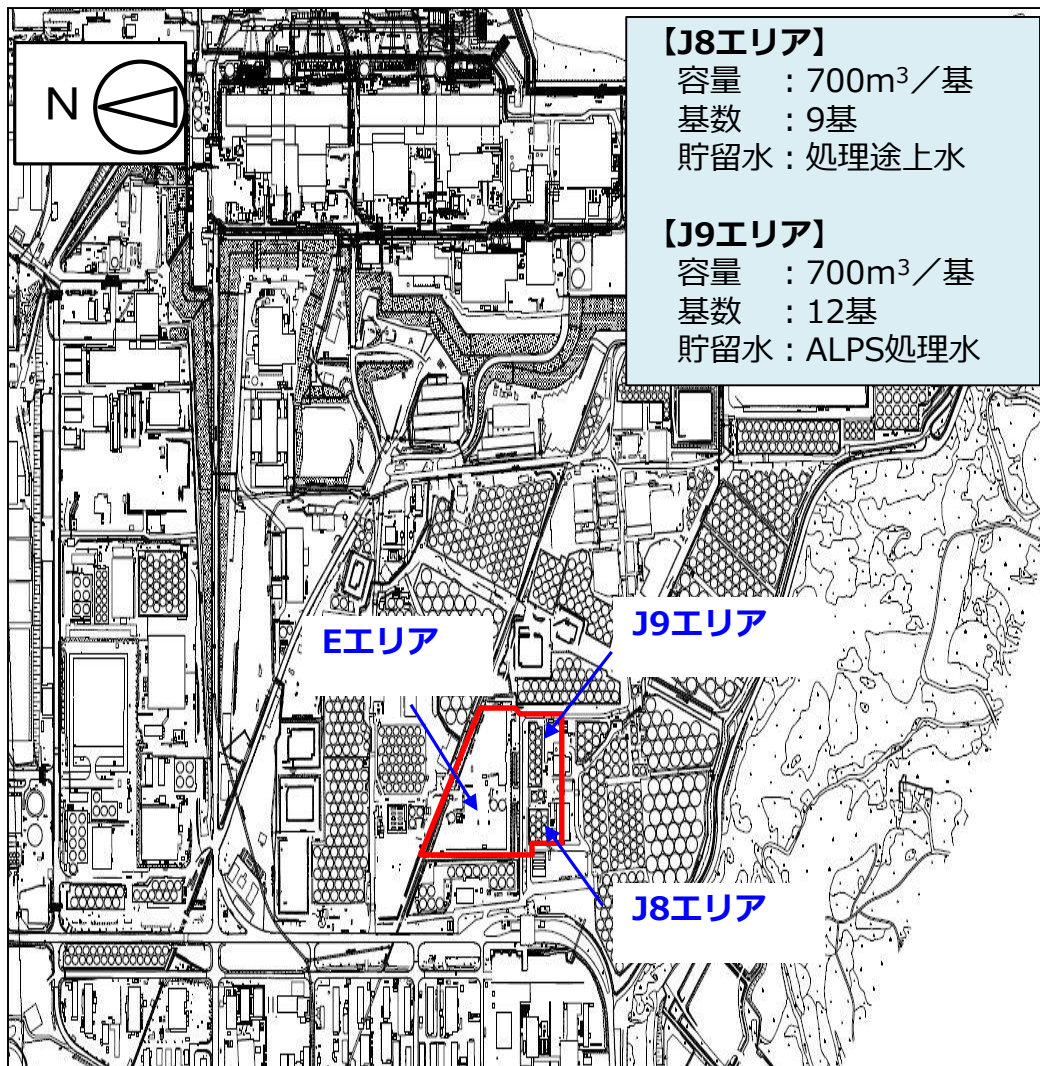

解体完了 タンク	解体完了日	解体完了 タンク	解体完了日
A6	2025年3月4日	B6	2025年6月10日
A5	2025年3月14日	B5	2025年6月19日
A4	2025年3月31日	B4	2025年7月1日
A3	2025年4月10日	B3	2025年7月11日
A2	2025年4月21日	B2	2025年7月30日
A1	2025年5月14日	B1	2025年9月3日



＜解体片を保管している
20フィートフルハイトコンテナ＞
